



DIGITAL WORKSHOP

UPGRADE DEI SISTEMI GESTIONALI E MIGRAZIONE IN CLOUD (SAAS) COME SAP PUBLIC EDITION

15 MAGGIO 2025 – ORE 14:00/15:30


Progetto di upgrade dei sistemi gestionali: punti di attenzione
Lucio Sciacchitano, Adeodata Srl

AGENDA


- Comprendere il progetto e la necessità del business
 - Digitalizzazione e innovazione
 - Project management & performing organization
 - Realizzazione del valore
- Valutare l'impatto della release note per chiarire l'ambito
- Migrazione dati e risorse coinvolte
- Fermo produttivo per le attività di cut-over e go-live
- Piano di progetto e carico di lavoro
- Opportunità di innovazione e reengineering

- Trasformare dati e processi in formato digitale
- Forma e aggregazione dei dati per prendere decisioni in maniera rapida ed «informata»


Progetti di ...



PROJECT MANAGEMENT & PERFORMING ORGANIZATION

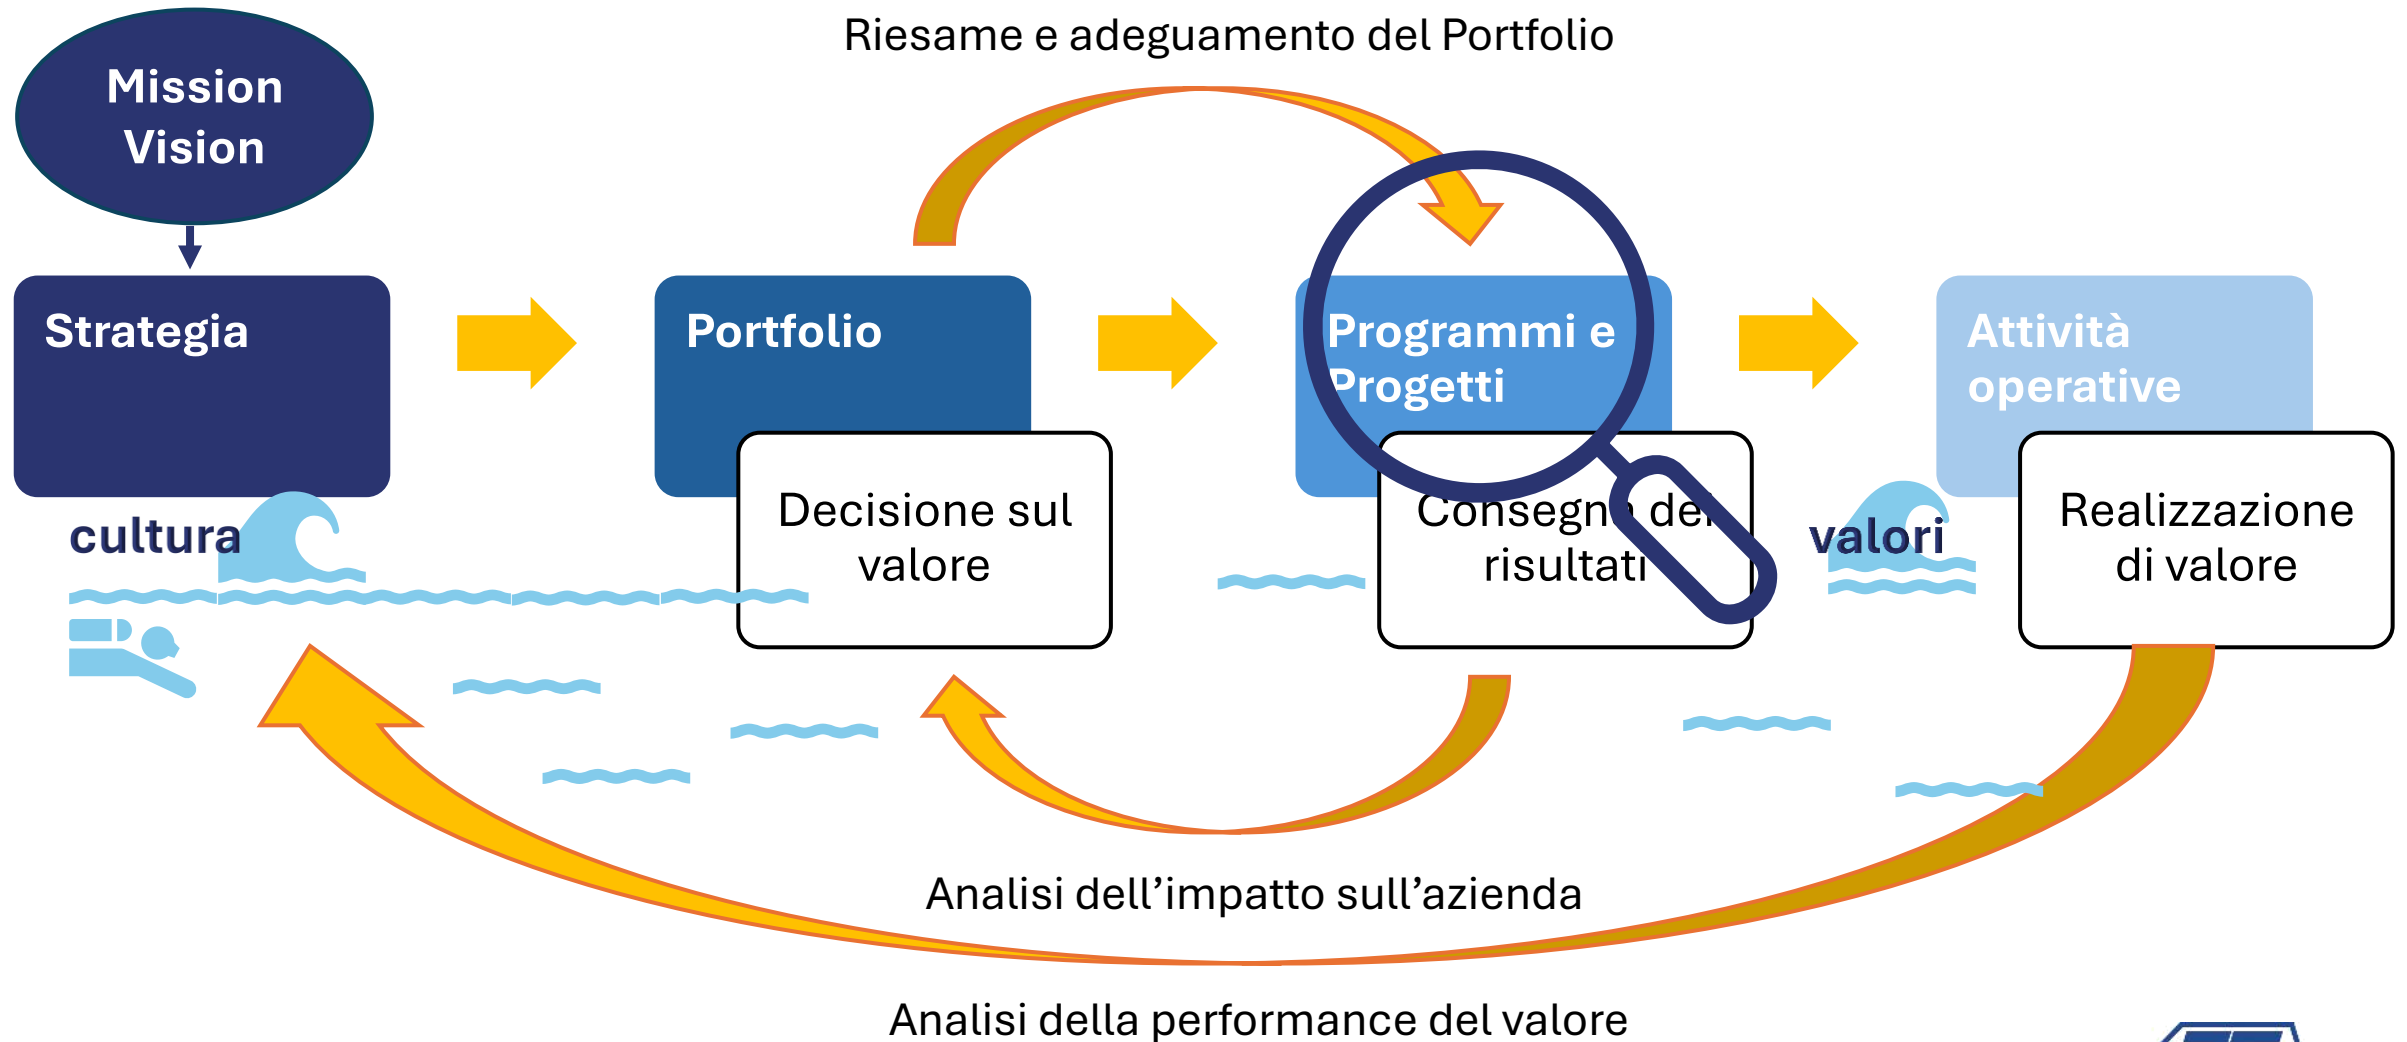

REALIZZAZIONE DEL VALORE

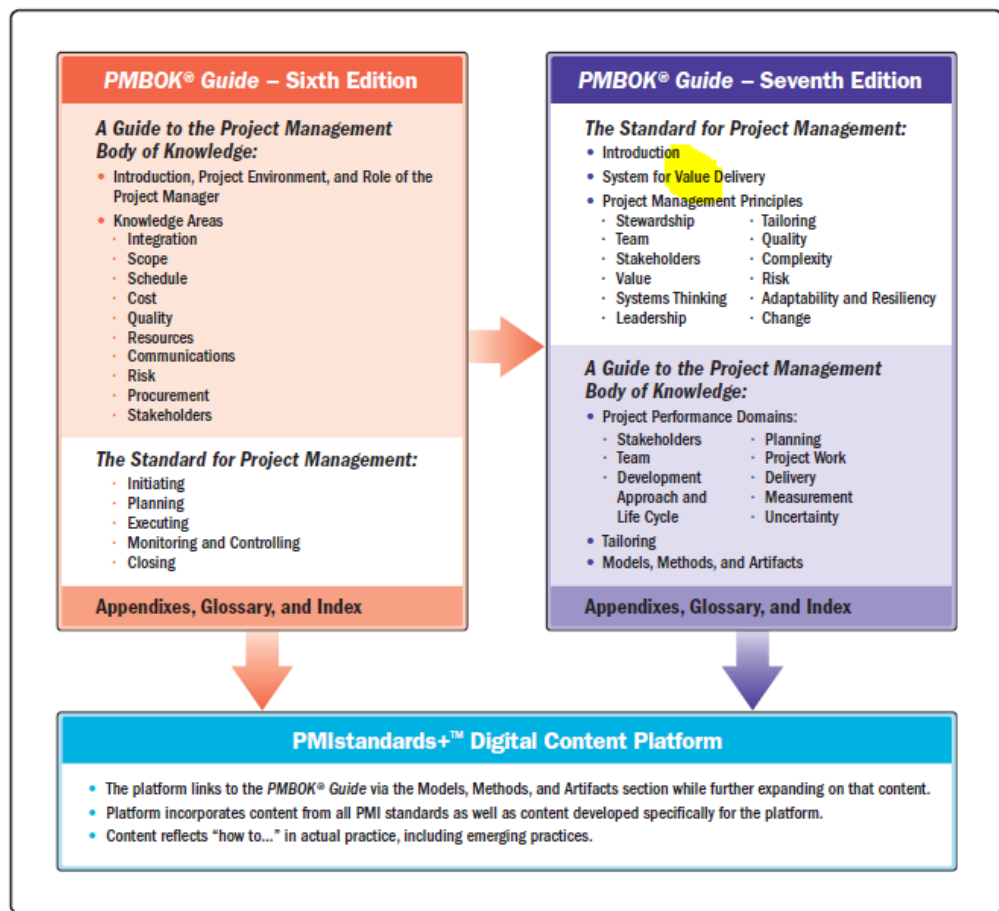

TEMPO DEL
PROGETTO


TEMPO DI VALUTAZIONE DEL VALORE

REALIZZAZIONE DEL VALORE



TEMPO DEL
PROGETTO

TEMPO DI VALUTAZIONE DEL VALORE




Componente Oggettiva

- Tempo
- Energia

Componente Soggettiva

- Significato/Senso

PARAMETRI DEL PROGETTO

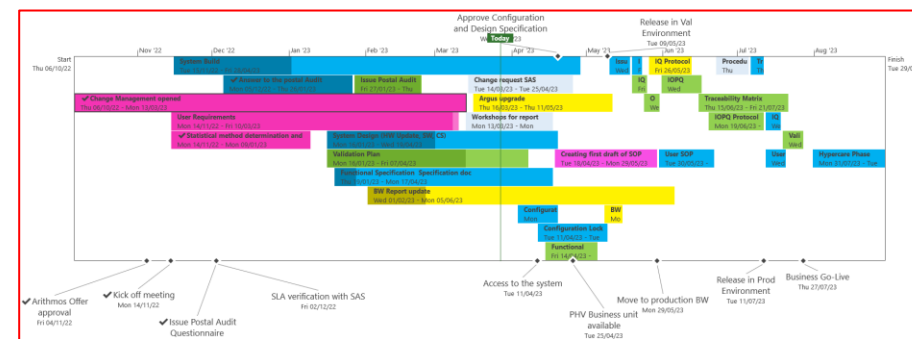

Percorso critico!

PROJECT OVERVIEW


THU 06/10/22 - TUE 29/08/23



MILESTONES DUE
Milestones that are coming soon.

Name	Finish
SLA verification with SAS	Fri 02/12/22
PHV Business unit available	Tue 25/04/23
Access to the system	Tue 11/04/23
Approve Configuration and Design Specification	Wed 19/04/23
Release in Val Environment	Tue 09/05/23
end of Report enhancements in DEV/QA (including the scheduled extraction)	Fri 14/04/23
Move to production BW	Mon 29/05/23
Business Go-Live	Thu 27/07/23


% COMPLETE
Status for all top-level tasks. To see the status for subtasks, click on the chart and update the outline level in the Field List.




LATE TASKS
Tasks that are past due.

Name	Start	Finish	Duration	% Complete	Resource Names
SLA verification with SAS	Mon 21/11/22	Fri 02/12/22	10 days	00%	Adeodata
Issue Functional Specification Spec. Doc.	Thu 19/01/23	Fri 07/04/23	57 days	11%	Arthmos (CSV/QA MAN)
connection to the BW in order to extract data	Thu 02/02/23	Wed 01/03/23	20 days	99%	
extend patient exposure calculation to all ingredients	Thu 02/03/23	Fri 31/03/23	22 days	0%	
Argus upgrade	Thu 16/03/23	Thu 11/05/23	40 days	0%	
Change impact assessment evaluation	Tue 14/03/23	Wed 26/04/23	31 days	0%	
Change request SAS	Tue 14/03/23	Tue 25/04/23	30 days	0%	
Issue Postal Audit Report	Fri 27/01/23	Thu 23/02/23	20 days	99%	Adeodata


VALUTARE L'IMPATTO DELLA RELEASE NOTE PER CHIARIRE L'AMBITO

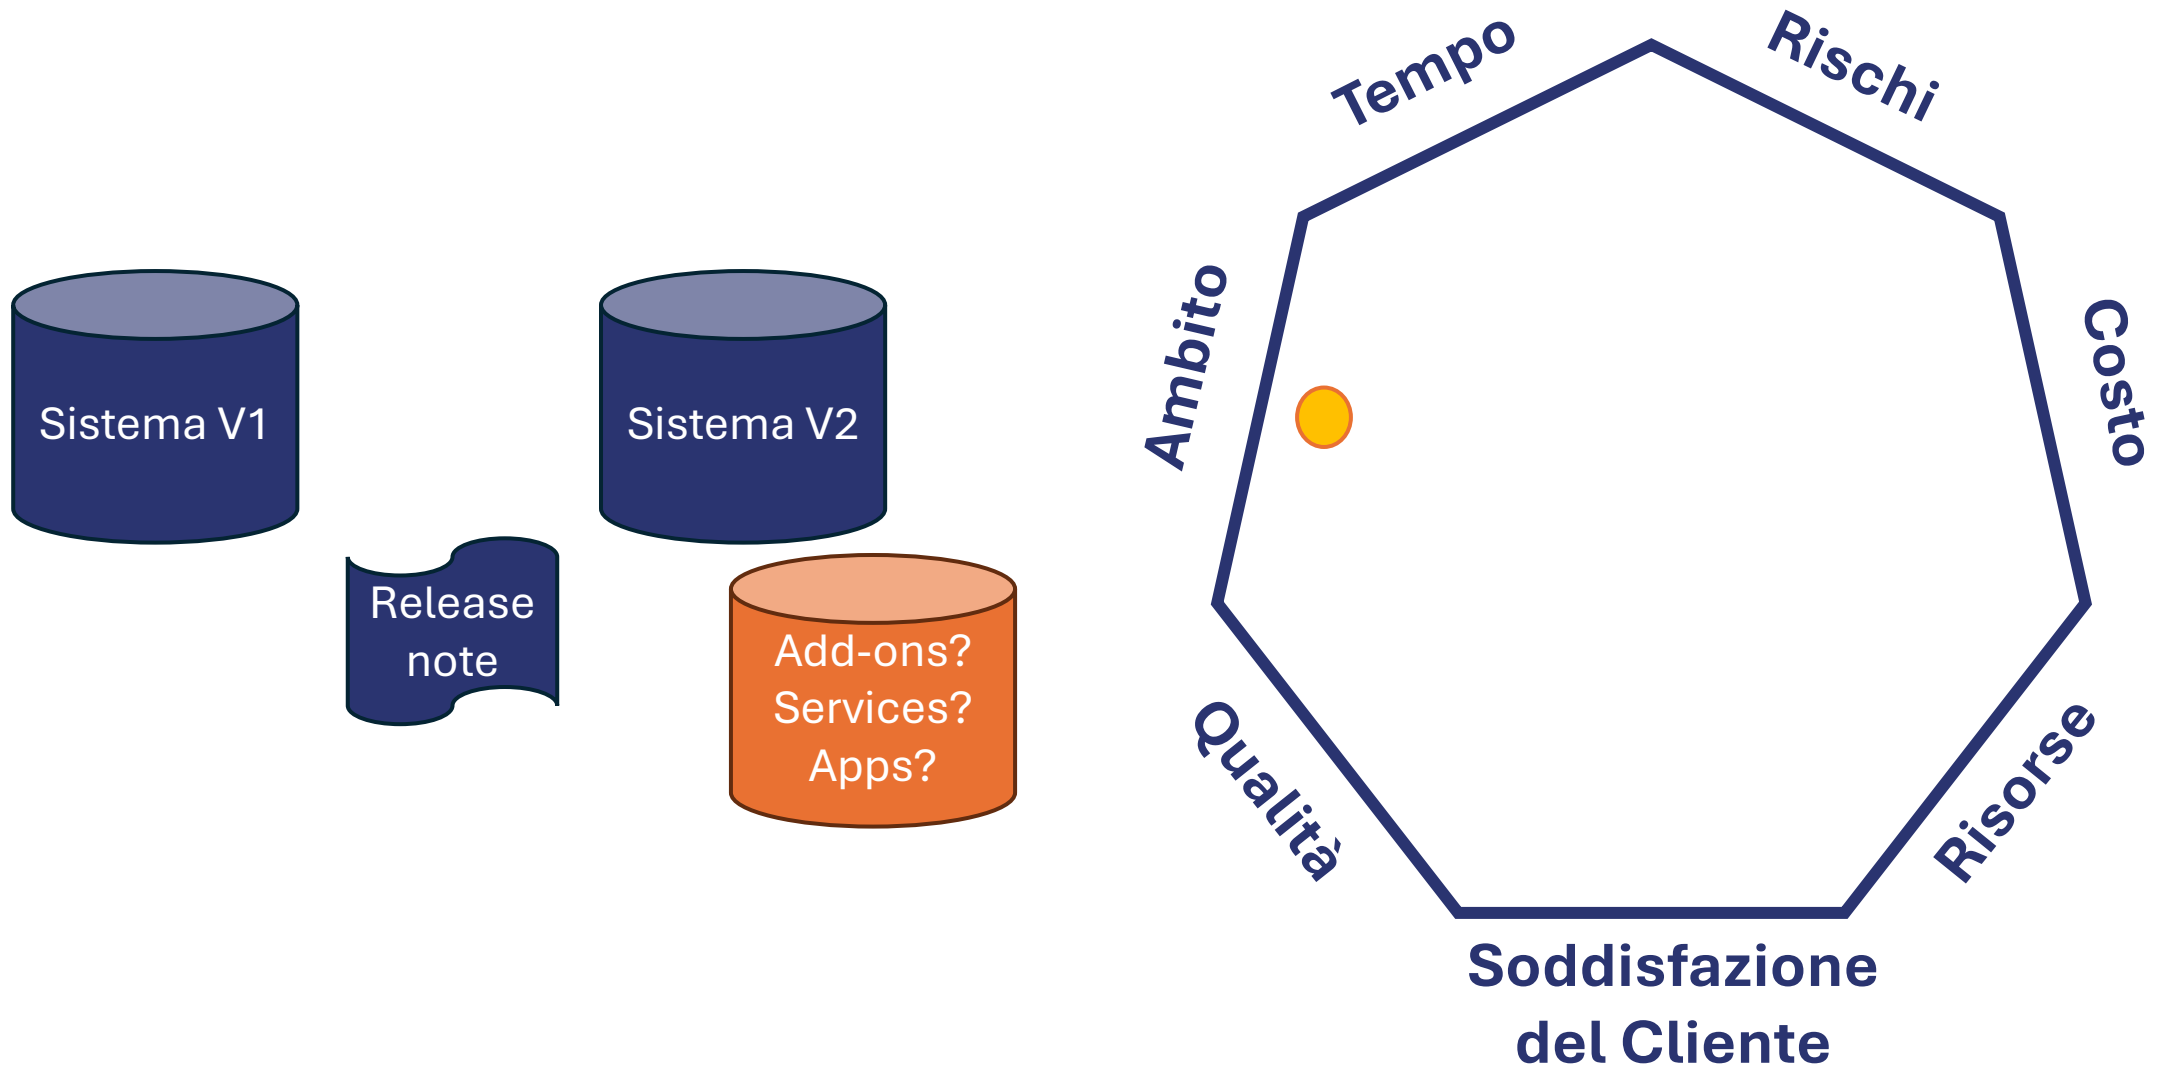




MIGRAZIONE DATI E RISORSE COINVOLTE

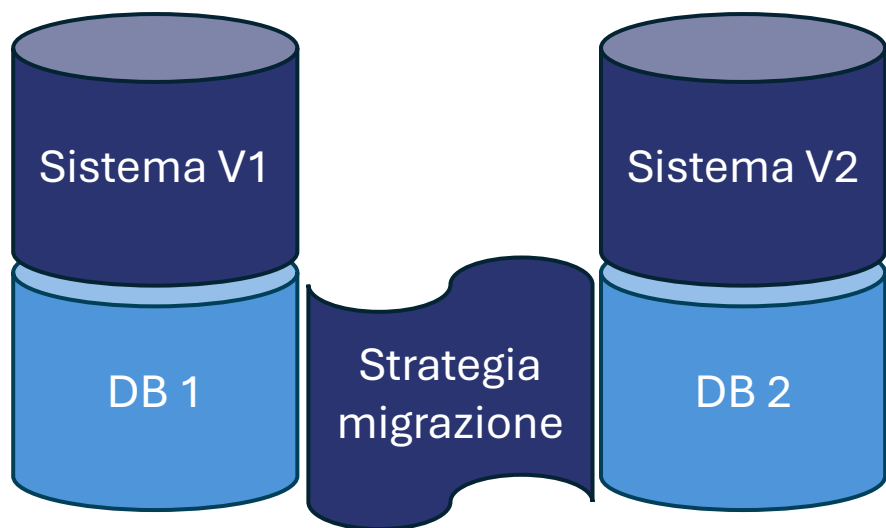

FERMO PRODUTTIVO PER LE ATTIVITÀ DI CUT-OVER E GO-LIVE

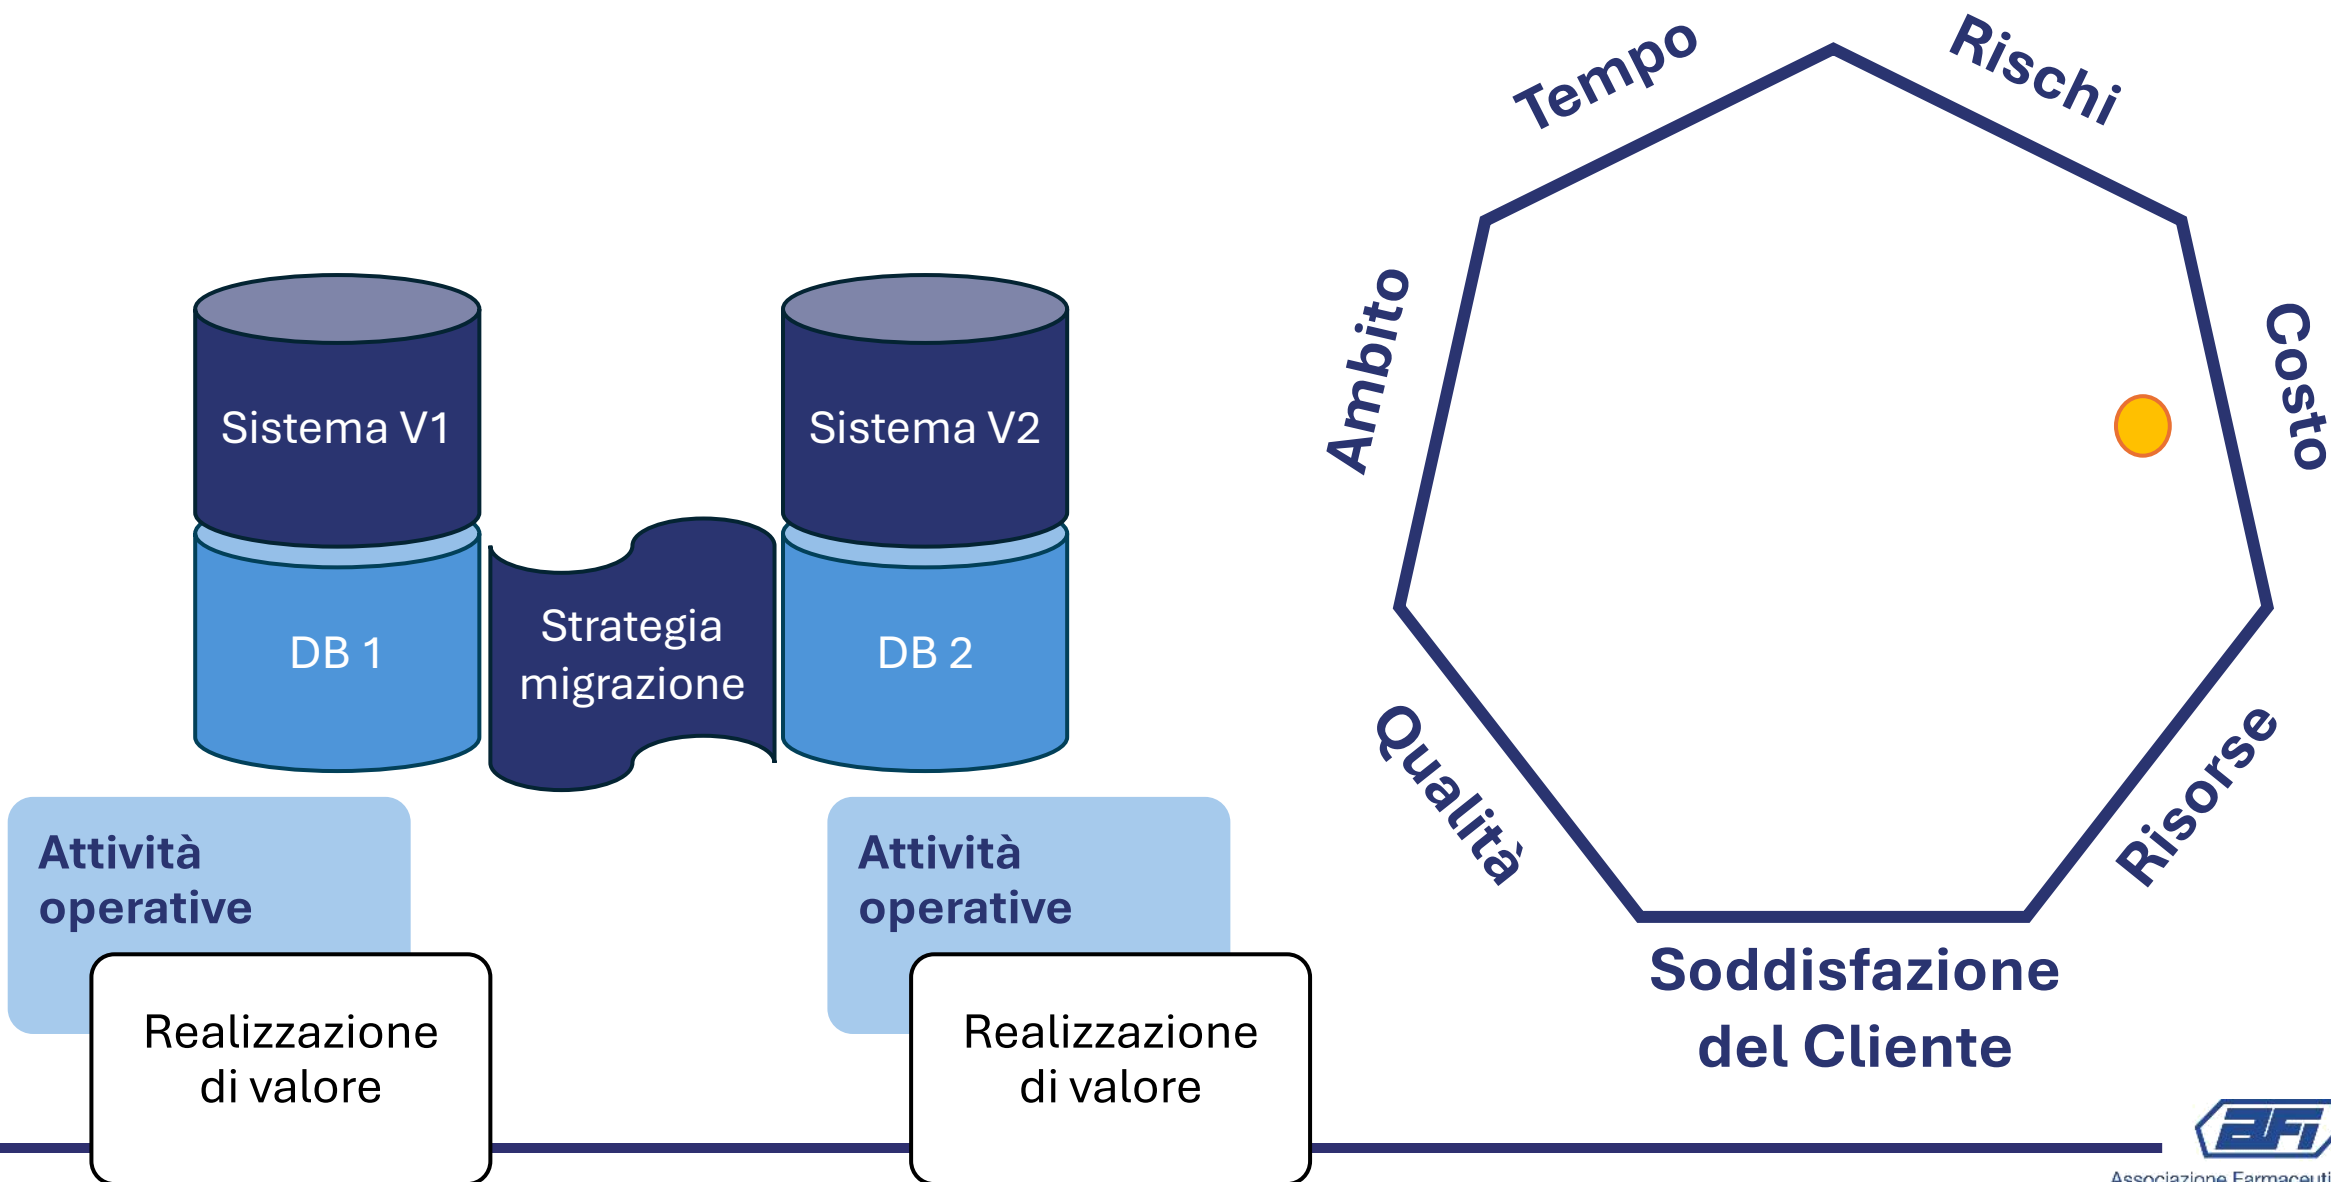

PIANO DI PROGETTO E CARICO DI LAVORO

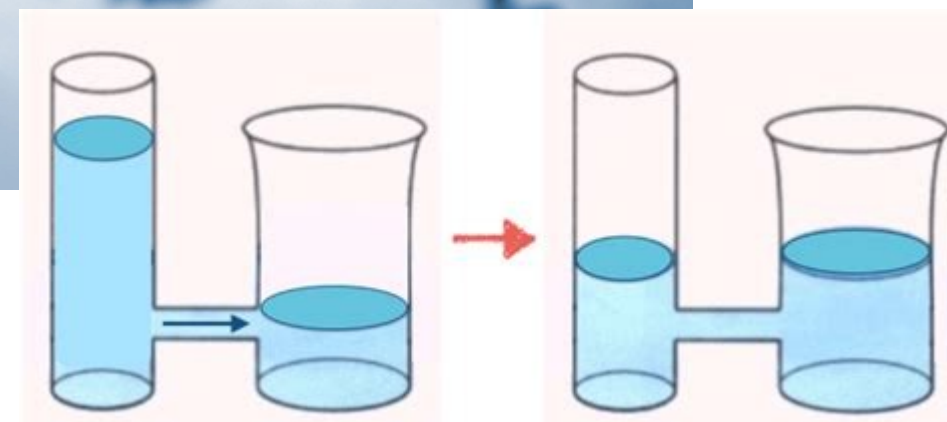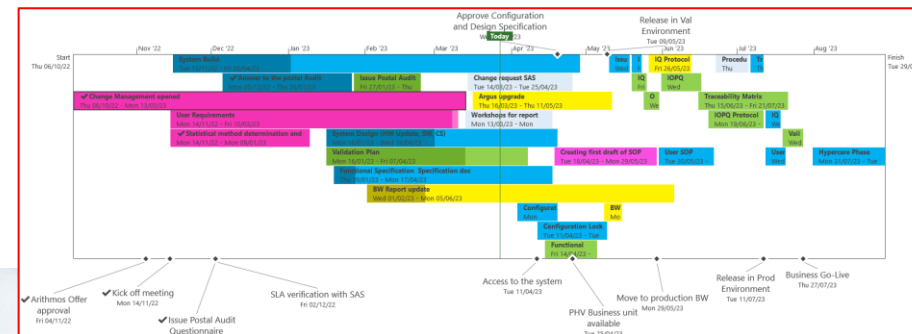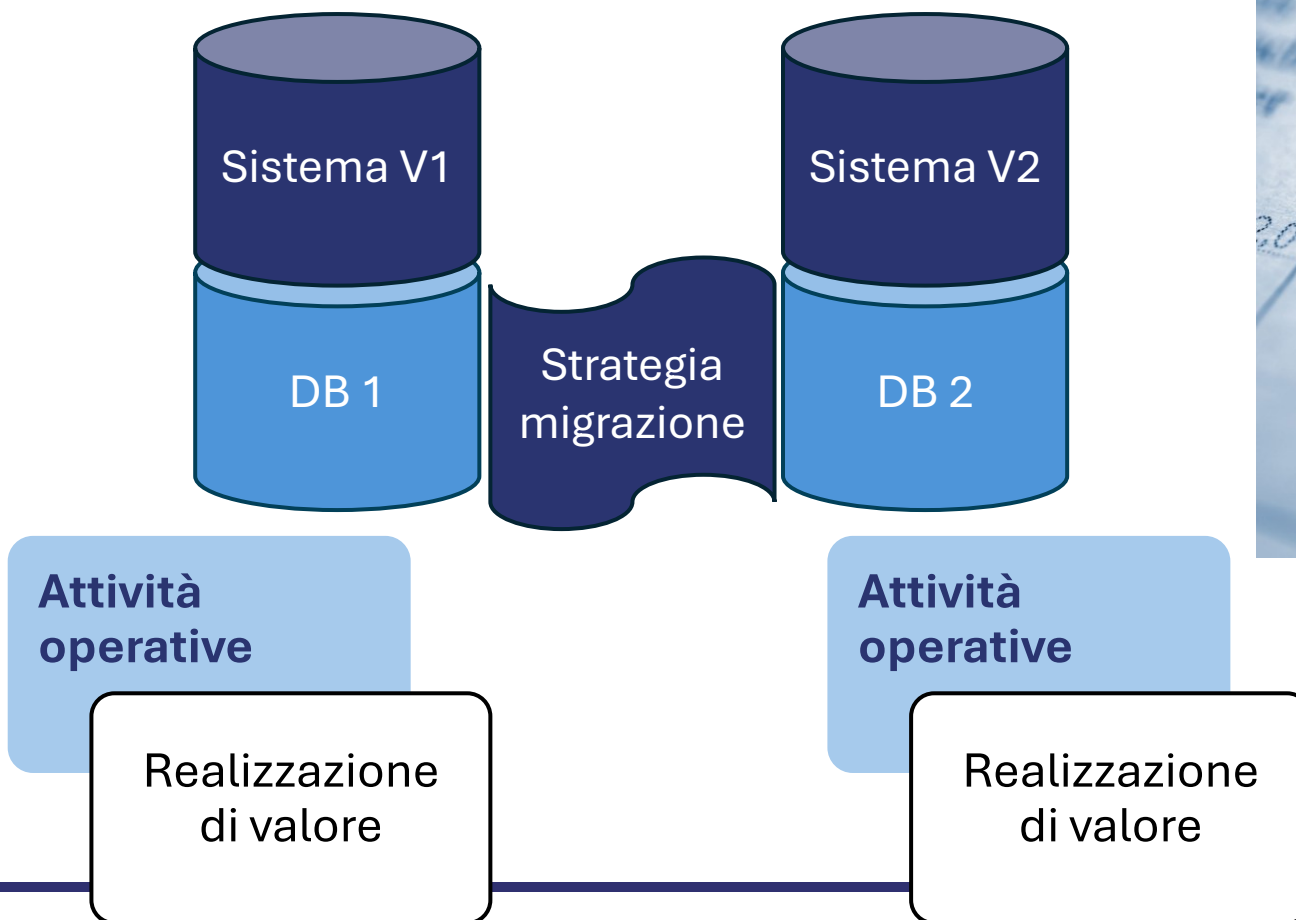

OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE E REENGINEERING

